



ŠIAULIAI

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TARYBA

2025 m. kovo 26 d.

Posėdžio darbotvarkė:

- 1. Regioninio planavimo projektų įgyvendinimo eiga,**
- 2. Kiti klausimai.**



ŠIAULIAI

Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų investicijų pritraukimas 2016-2024 m.

Pritrauktos lėšos (mln./eurų):	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.
Kelių plėtros programa ir jos rezervas	2,93	2,39	2,85	4,65	9,14	3,83	5,52	7,25	8,70
Valstybės biudžeto lėšos	0,89	3,50	1,89	1,42	11,02	5,81	3,75	12,80	8,69
Europos Sąjungos ir VB lėšos (senasis laikotarpis)	2,85	20,87	11,17	10,40	6,56	10,56	1,55	4,80	0,62
Europos Sąjungos lėšos (naujasis laikotarpis + Naujos kartos planas)								8,33	64,23
Dotacijos skirtos Viešųjų investicijų plėtros agentūros	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,63	0,00	0,00	0,00
IŠ VISO:	6,67	26,76	15,91	16,47	28,71	20,85	10,82	33,18	82,24

Naujų projektų įgyvendinimui 2024 m. pritrauktos Europos Sąjungos ir valstybės lėšos tūkst. Eur

Projekto pavadinimas	Lėšų suma
Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, vidurio ir vakarų Lietuvos regione (Atvejo vadyba)	411,76
Sporto skyriaus darbuotojų mobilumo mokymosi tikslais skatinimas, siekiant užtikrinti gebėjimų stiprinimą ir plėtrą	15,49
Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Šiaulių miesto savivaldybėje	773,65
Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų	1 818,83
Inovacijų plėtra viešojo sektoriaus institucijose	86,90
Vientiso dviračių takų tinklo kūrimas integruojant bevariklį transportą į bendrą transporto sistemą	18 700,00
Edukacinių erdvių įrengimas Šiaulių miesto ugdymo įstaigose, vystant visos dienos mokyklos veiklas	1 499,98
Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje	2 000,00
Ugdymo priemonės mokykloms	2 660,06
Tankiai apgyvendintos Šiaulių miesto urbanizuotos teritorijos atgaivinimas, žalinimas ir funkcionalumo didinimas	3 216,77
Eismo saugos gerinimas Šiaulių mieste, šalinant juodąsias dėmes	850,00
Sveikatos centrų sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Šiaulių miesto savivaldybėje	4 199,69
Šiaulių miesto „Romuvos“, Dainų ir Salduvės progimnazijų bei Didždvario ir Lieporių gimnazijų lauko infrastruktūros atnaujinimas, pritaikymas ugdymo poreikiams ir funkcionalumo didinimas	3 975,00
Ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas Šiaulių miesto savivaldybėje	2 500,00
Bendrojo ugdymo, neformaliojo ugdymo ir kitų viešųjų paslaugų teikimui trūkstamos infrastruktūros sukūrimas, adresu J. Jablonskio g. 14, Šiauliai	13 688,15
Bendrojo ugdymo paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Šiaulių mieste, modernizuojant Šiaulių Ragainės progimnaziją	2 550,00
Lieporių parko atgaivinimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai	2 549,99
Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro jojimo skyriaus modernizavimas, sukuriant tinkamas sąlygas visuomenės sveikatos stiprinimo, neformaliojo švietimo viešųjų paslaugų teikimui, gyventojų poilsio organizavimui	9 287,54
	Iš viso: 70 783,81


2024 m. pritrauktos valstybės biudžeto lėšos tūkst. Eur

Projekto pavadinimas	Lėšų suma
GovTech4All	50,00
Aukštabalio gatvė nuo Tilžės gatvės iki Išradėjų (Baltų) gatvės tiesimas ir rekonstravimas	862,10
Pramonės gatvės atkarpos ir jos prieigų nuo Serbentų gatvės iki Bačiūnų gatvės rekonstrukcija.	2 803,90
Gytarių progimnazijos, K. Korsako g. 10, sporto aikštyno atnaujinimas	232,00
Susisiekimo infrastruktūros įrengimas iki investicinio sklypo, kuriame planuojamas įgyvendinti regioninės svarbos projektas	122,28
Paviršinių nuotekų infrastruktūros įrengimas iki investicinio sklypo, kuriame planuojamas įgyvendinti regioninės svarbos projektas	691,87
Palankių investavimo sąlygų užtikrinimas Šiaulių pramonės parko teritorijoje, tinkamai paruošiant sklypus	36,29
Paviršinių nuotekų inžinerinių tinklų įrengimas Šiaulių laisvosios ekonominės zonos teritorijoje ir iki investicinio sklypo, kuriame planuojamas įgyvendinti „stambaus projekto“ statusą turintis projektas	1 030, 62
Šiaulių miesto miškų sklypų suformavimas ir įregistravimas Nekilnojamo turto registre	3,88
Iš viso:	5 832,94



ŠIAULIAI

Numatyta ES lėšų regionams Regionų plėtros programoje (RPP), mln. Eur

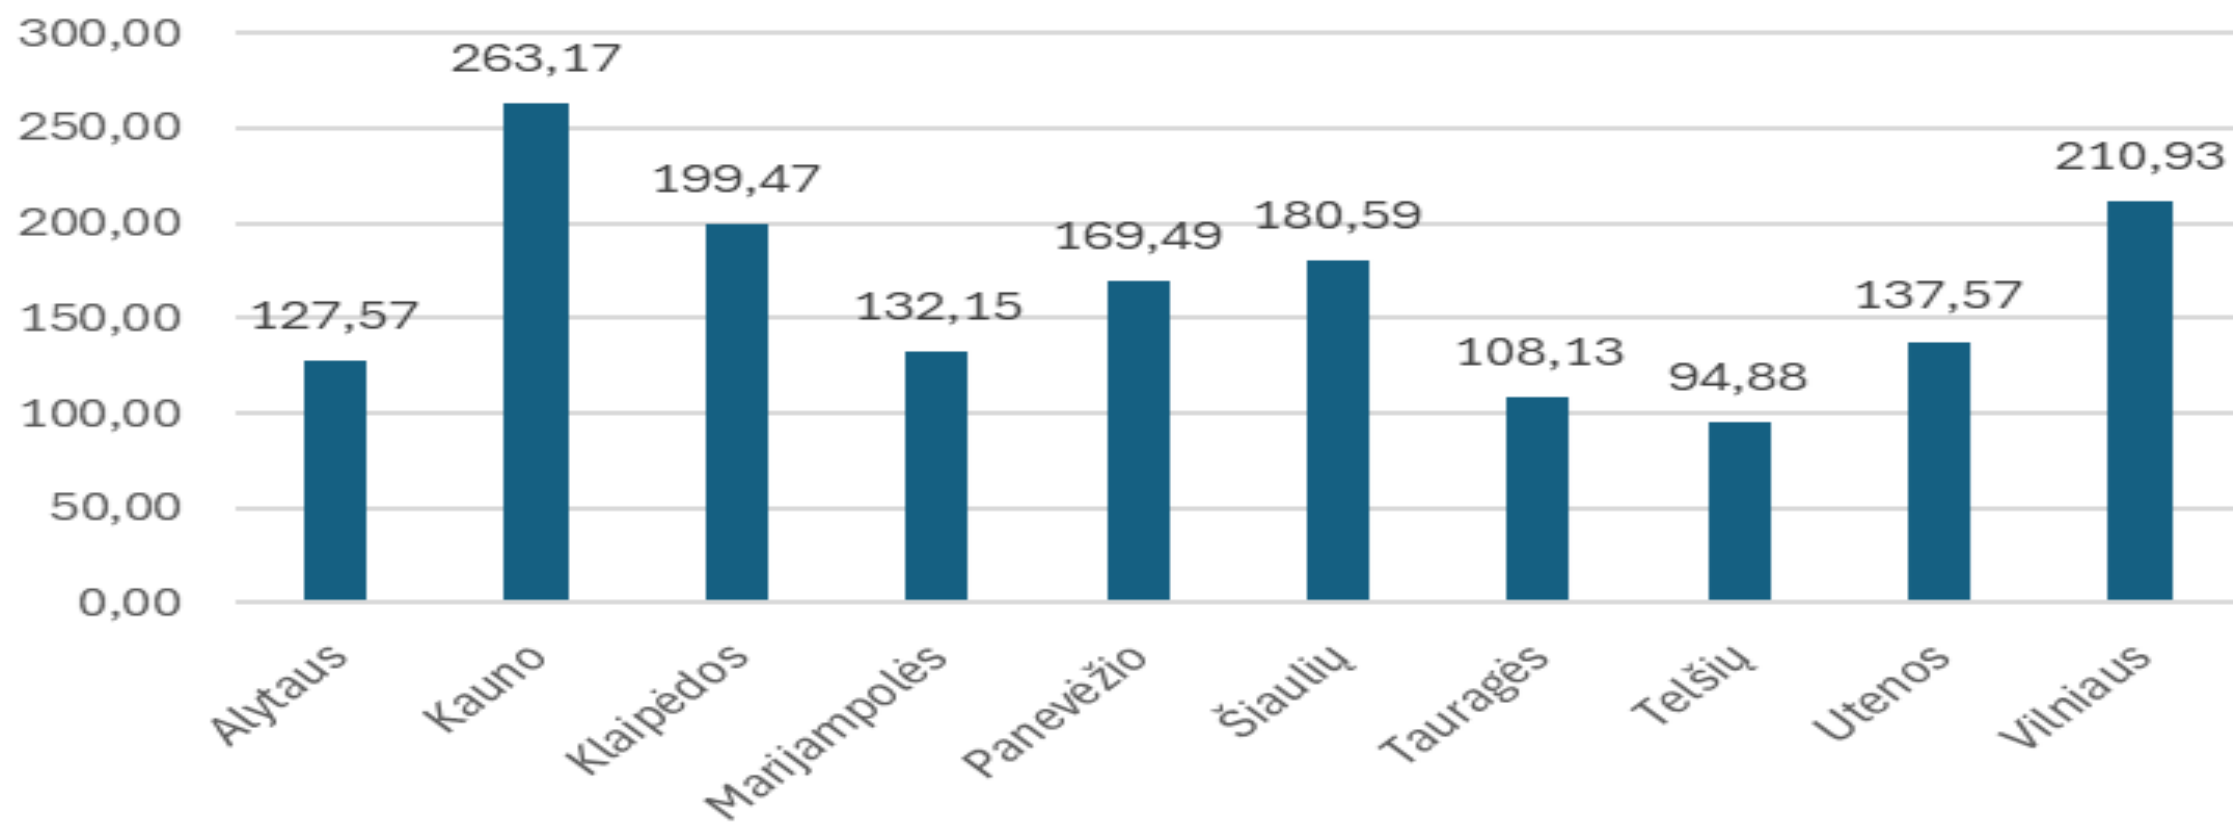

ŠIAULIAI

Regionų plėtros planų įgyvendinimo pažanga 2025-02-20

Regionas	Numatyta RPP	Paskelbta kvietimų	Vertinama PĮP	Pasirašyta sutarčių	Išmokėta projektams
Alytaus	127 572 900,00	39 792 511,25	22 556 903,57	28 596 582,92	2 589 636,90
Kauno	263 170 500,00	56 994 423,85	61 090 340,69	38 773 828,75	3 632 325,72
Klaipėdos	199 468 000,00	13 790 103,50	49 295 905,46	41 192 997,19	188 013,31
Marijampolės	132 151 900,00	37 955 141,24	61 070 621,49	19 597 841,63	510 218,24
Panevėžio	169 486 200,00	32 686 675,47	23 408 295,98	16 563 424,70	296 533,00
Šiaulių	180 589 200,00	29 406 517,00	41 057 451,30	70 161 203,53	7 545 448,00
Tauragės	108 129 500,00	21 031 181,54	29 751 618,69	37 209 413,40	3 854 876,25
Telšių	94 880 800,00	19 668 951,00	19 368 488,94	11 932 397,12	54 202,55
Utenos	137 568 400,00	17 272 418,15	17 358 348,83	25 753 562,78	1 712 850,12
Vilniaus	210 928 800,00	46 551 383,82	114 315 608,87	21 369 706,06	0,00
IŠ VISO	1 623 946 200,00	315 149 306,82	439 273 583,82	311 150 958,08	21 895 084,52
Šiaulių miestas	67 304 263,00 (+ VB 4 521 022,25)	0,00 (Laukiama 938 863,65)	5 563 636,35 (+VB 811 363,64). Vertinimai baigti.	60 711 761,00 (+VB 3 709 658,61)	7 397 000,00



ŠIAULIAI


Vientiso dviračių takų tinklo kūrimas integruojant bevariklį transportą į bendrą transporto sistemą

Per 2024 metus:

- įrengta/rekonstruota apie 6,8 km dviračių takų ir dviračių gatvių;
- pradėti rangos darbai objektuose, kuriuos užbaigus bus įgyvendinta dar apie 2,7 km;
- pradėti rengti projektai/ tęsiamas projektavimas dar 8 atkarpoms (apie 11 km),
- paskirti likusių atkarpų kuratoriai ir pradėti rengti dokumentai projektavimo paslaugų pirkimui.


Per 2025 metus:

- atnaujinti rangos darbai 2024 m. pradėtuose objektuose,
- perkama: Serbentų ir Žemaitės gatvių rangos darbai (apie 4,6 km),
- 7 atkarpų projektavimas (apie 12,5 km),
- ruošiami dokumentai likusių projektavimo paslaugų pirkimui.

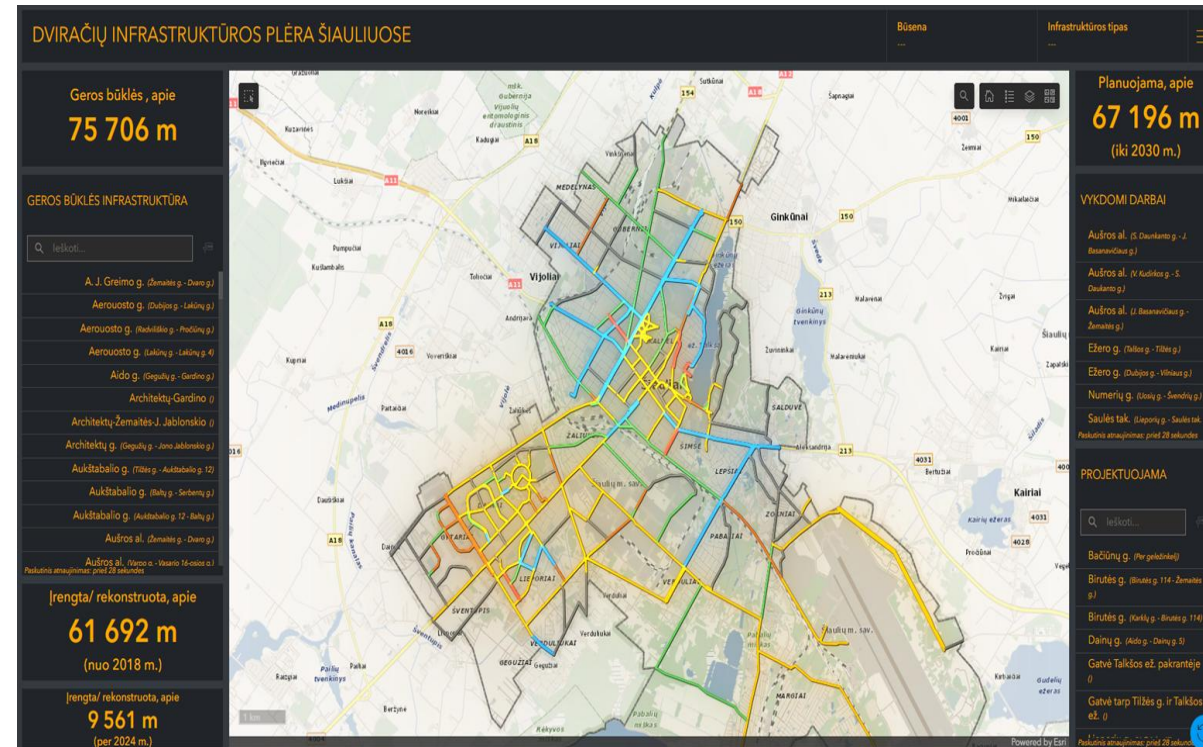

Vientiso dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo kūrimas, integruojant bevariklį transportą į bendrą transporto sistemą Šiaulių mieste, II etapas

- Paskirti objektų (4 atkarpos) kuratoriai.
- Patvirtinta 1 techninė užduotis projektavimui.
- Veiklų įgyvendinimas planuojamas etapais iki 2029 m.

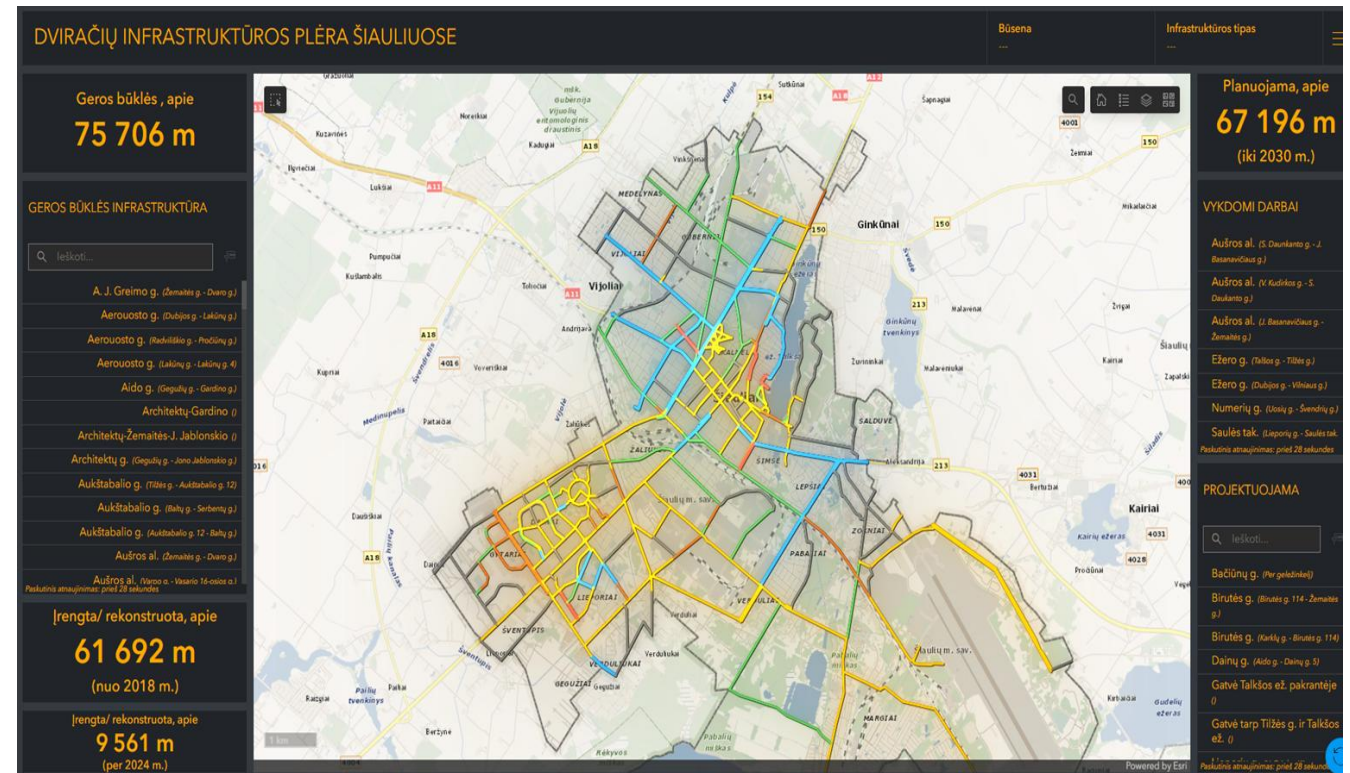


Eismo saugos gerinimas Šiaulių mieste, šalinant juodašias dėmes

- 2024 m. įrengta šviesoforinė Gardino/Aido g. sankryža.
- 2025 m. planuojama įgyvendinti saugumo priemonės:
Aušros al./Kudirkos g. sankryžoje;
Žemaitės g./Vaidoto g. sankryžoje.
- 2026 m. - Daukanto/Vytauto g. sankryžoje.



ŠIAULIAI

Tankiai apgyvendintos Šiaulių miesto urbanizuotos teritorijos atgaivinimas, žalinimas ir funkcionalumo didinimas: kvartalo, kurį riboja Rasos g. ir Aukštabalio g. konversija ir pritaikymas bendruomenės poreikiams

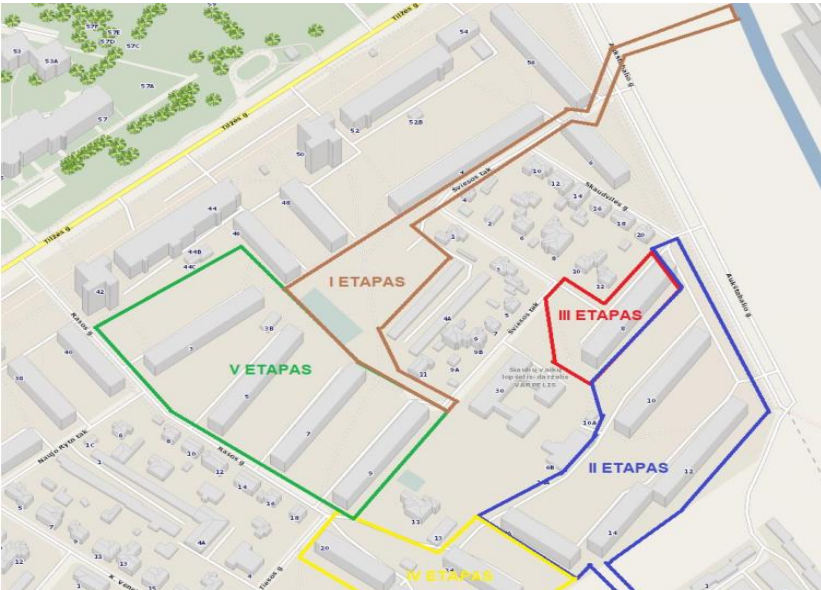

- 2024-06-26 pasirašyta rangos darbų sutartis.

Darbų eiga:

- I etapas – bendroji zona tarp Rasos g. 3, 5, 7, Tilžės g. 46, 48, Aukštabalio g. 4, 4A. Darbai pradėti 2024 m. greitu metu bus baigti.
- II etapas – zona apimanti Aukštabalio g. 10, 12, 14, Rasos g. 26 daugiabučius namus. Darbai pradėti 2024 m.
- III etapas – zona apimanti Aukštabalio g. 8 daugiabutį namą. Darbų pradžia 2025 m. kovo mėn.
- IV etapas – zona apimanti Rasos g. 20, 22, 24 daugiabučius namus. Planuojama darbus pradėti šių metų balandžio mėnesį.
- V etapas – zona apimanti Rasos g. 3, 5, 7, 9 daugiabučius namus. Darbų pradžia planuojama šių metų gegužės mėnesį.
- Didžioji dalis darbų bus užbaigta 2025 m., o smulkūs baigiamieji darbai pereis į kitus metus.
- Visi darbai apims automobilių stovėjimo aikšteles, vaikų žaidimų aikšteles, takų, įvažiavimų, gatvių rekonstrukciją, taip pat žaliųjų ir rekreacinių zonų tvarkymą.



ŠIAULIAI

Šiaulių miesto darnaus judumo plane numatytų priemonių, prisidedančių prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, įgyvendinimas

- „Statyk ir važiuok” aikštelės:
Vilniaus/Serbentų;
Gegužių (netoli sankryžos su Karaliaučiaus g.);
Dubijos/Architektų g (buv. metalinių garažų teritorijoje).
- Šiuo metu rengiama dokumentacija projektavimui.
Įgyvendinimas - 2026-2027 m.



ŠIAULIAI

Futbolo ir regbio maniežo statyba, adresu J. Jablonskio g. 14, Šiauliai



- 2024 m. gegužės 14 d. pasirašyta statybos rangos sutartis Nr. SŽ-819 su UAB „Veikmės statyba“.
- Sutarties vertė 17 854 065,08 Eur.
- Statybos darbai pradėti vykdyti - 2024 m. birželio mėn.
- Šiuo metu yra įvykdyta 22,43% objekto vertės, kas sudaro 4 004 890,19 Eur su PVM.
- Įrengti pamatai, sumontuotos gelžbetoninės konstrukcijos, perdangos plokštės.
- Mūrijamos sienos.
- Įrengti lauko drenažo tinklai.
- Sumontuota apie 90 % lauko vandentiekio, elektrotechnikos tinklų; apie 80 % lauko nuotekų, lietaus surinkimo tinklų.



ŠIAULIAI



Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro jojimo skyriaus atnaujinimas ir plėtra

- UAB „BENDRIEJI STATYBŲ PROJEKTAI“ parengė techninį projektą, kuriame planuojama įrengti dengtą maniežą ir arklides.
- Gavus statybos leidimą 2025 m. II ketvirtyje planuojama nupirkti rangos darbus.
- Siekiant pritraukti daugiau rangovų projektas paviešintas CVPIS.



ŠIAULIAI

Ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas Šiaulių miesto savivaldybėje



- UAB „Statybos projektai“ parengė techninį projektą.
- Derinami pirkimo dokumentai.
- Statybos darbus planuojama nupirkti 2025 m. II ketvirtyje.
- Statybos darbų pabaiga numatoma 2026 m.



ŠIAULIAI

Vinco Kudirkos progimnazijos pastato (Dvaro g. 129, Šiauliai) atnaujinimas ir modernizavimas



- Projektą rengia UAB „Panevėžio miestprojektas“.
- Techninį projektą planuojama parengti 2025 m. II ketv.
- Statybos darbus planuojama nupirkti 2025 m. IV ketvirtyje.



ŠIAULIAI

Ragainės progimnazijos pastato (Tilžės g. 85, Šiauliai) atnaujinimas ir modernizavimas



- Projektą rengia UAB „Synergy Solutions”.
- Techninį projektą planuojama parengti 2025 m. III ketv.
- Statybos darbus planuojama nupirkti 2025 m. IV ketvirtyje.



ŠIAULIAI

**Simono Daukanto inžinerijos gimnazijos pastato (S. Daukanto g. 71, Šiauliai)
modernizavimas bei funkcionalumo didinimas, pritaikant jį pagrindiniam bei viduriniam
ugdymui pagal specializuotas inžinerinio ugdymo programas**



- Projektą rengia UAB „Egna“.
- Techninio projekto parengimas vėluoja, planuojama, kad bus parengtas 2025 m. II ketv.
- Statybos darbus planuojama nupirkti 2025 m. III ketv.



ŠIAULIAI

Šiaulių miesto „Romuvos“, Dainų ir Salduvės progimnazijų bei Didždvario ir Lieporių gimnazijų lauko infrastruktūros ir aplinkinių teritorijų funkcionalumo didinimas



- Atliktos projektų ekspertizės.
- Projektai sukelti į Infostatyba puslapį statybą leidžiančiam dokumentui gauti.
- Pirkimo dokumentai perduoti Švietimo aprūpinimo centrui. Rengiami pirkimo dokumentai CPVA patikrai.
- Statybos darbus planuojama nupirkti 2025 m. II-III ketvirtyje.
- Planuojama darbų pabaiga 2026 m.



ŠIAULIAI

Užimtumo paslaugų asmenims su intelekto ir (ar) proto negalia plėtra Šiaulių mieste

Socialinės
dirbtuvės



- Vykdomas projekto socialinių dirbtuvių paslaugos partnerio atrankos konkursas:
 - *iki 2025 m. kovo 28 d. atlikus paraiškų vertinimą, bus priimtas sprendimas dėl socialinių dirbtuvių paslaugos partnerio paskyrimo.*
- *2025 m. kovo 18 d. paskelbtas kvietimas teikti projekto įgyvendinimo planą pagal priemonę Nr. 26-420-P „Institucinės globos pertvarkai reikalingų paslaugų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Šiaulių regione VIII“. Projekto įgyvendinimo planas turi būti pateiktas iki 2025 m. gegužės 30 d.*



ŠIAULIAI

Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šiaulių mieste, II etapas



- Grupinio gyvenimo namų projektavimo darbus planuojama užbaigti II ketvirtį (*2 namai*).
- Suderinus visą Projekto dokumentaciją su CPVA (pirkimų planas, veiklos ataskaita), bus ruošiamasi pirkti apsaugotus būstus (*13 butų 3 kambarių*).



ŠIAULIAI

Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje



- Butų pirkimo konkursas paskelbtas kovo 13 d. Pasiūlymai teikiami iki kovo 26 d. 11 val.
- Pirkimu Nr. I perkami 2 vnt. vieno kambario, 1 vnt. dviejų kambarių ir 5 vnt. trijų kambarių butai Šiaulių mieste.
- 2024 m. vasario 7 d. išsiųstas raštas LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kuriame prašome leisti įsigyti kuo aukštesnės (bet ne žemesnės nei D) energinio naudingumo klasės pastatus (ar juose esančius būstus). Tačiau atsakymas iki šiol negautas.



ŠIAULIAI

Lieporių parko atgaivinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams



- vykdomi papildomi tikslūs geofiziniai pagrindų tyrimai inžinerinių įrenginių ir statinių vietose.
- atlikti detalūs šalintinių želdinių vertinimai plečiamai pėsčiųjų ir dviračių takų sistemai siekiant minimizuoti poveikį.
- Planuojama projektavimo pabaiga - užbaigus detalius tyrimus +70 d. d., t.y. 2025 m. III ketvirtį.
- Rangos darbai planuojami 2026-2028 metais.
- Per 2024 m. atlikta:
- Parengtos daugiau kaip trys galimų sprendinių koncepcijos, paviešinti keliuose aptarimuose su aktyvia miesto bendruomene, gavus bendrą pritarimą pasirinktai koncepcijai, patvirtinti privalomieji projektiniai pasiūlymai (PP).
- Pagal PP baigiamas papildomų tyrimų, pagal parinktas naujas išplečiamų pėsčiųjų ir dviračių takų sistemos trasų schemas, atlikimas.
- Vyksta betarpiškas gretimų teritorijų infrastruktūros pokyčių sprendinių integraciją realiaame laike.
- Darniais teritorijos funkciniais ryšiais tikslinami ir apjungiami kvartalo susisiekimo sistemos elementai į bendrą dviračių ir pėsčiųjų srautų kompleksinį sprendinį.



ŠIAULIAI

Edukacinių erdvių įrengimas Šiaulių miesto ugdymo įstaigose, vystant visos dienos mokyklos veiklas



- 2024-08-30 pasirašyta finansavimo sutartis, pradėtos įgyvendinti projekto veiklos.
- Projekto partneriai yra: Šiaulių Gytarių, Šiaulių „Juventos“, Šiaulių Vinco Kudirkos, Šiaulių Medelyno, Šiaulių „Rasos“, Šiaulių „Romuvos“, Šiaulių „Sandoros“, Šiaulių Zoknių progimnazijos ir Šiaulių Centro bei Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos.
- Remontuojamos patalpos: įrengiami sensoriniai kambariai, spalvų terapijos centrai, interaktyvūs kampeliai, robotikos, steam, fizinio ugdymo ir kitos zonos, laboratorijos,
- įrengiamos lauko klasės,
- perkama įranga ir baldai.
- Projekto trukmė 24 mėn.



ŠIAULIAI



ŠIAULIAI
